

CITTA' DI
VENEZIA




Direzione Lavori Pubblici
Settore Pronto Intervento Manutenzione e Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistrate e Sedi Terraferma
Polo Tecnico "La Carbonifera"
Viale Ancona, 63 Mestre - Venezia

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

**C.I. 14397 - EX SCUOLA EDISON - INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL'EDIFICIO**

**3 - CRONOPROGRAMMI DEL PROCEDIMENTO E DEI
LAVORI**

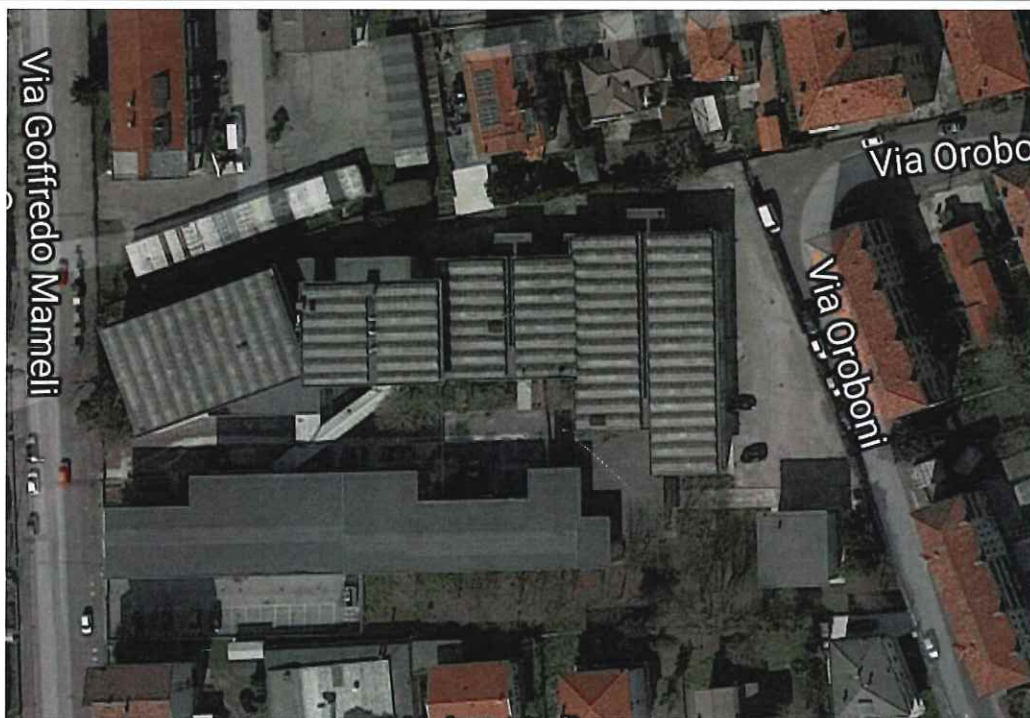

Mestre - Venezia, Dicembre 2018

Direzione Lavori Pubblici
Settore Pronto Intervento
Manutenzione e Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva,
Magistrate e Sedi Terraferma
Polo Tecnico "La Carbonifera"
Viale Ancona, 63 Mestre - Venezia

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Aldo Menegazzi

I Progettisti
geom. Furlanetto Chiara
geom. Longato Maurizio

p.i. Andrea De Martin Fabbro

PROGETTO ESECUTIVO
C.I. 14397 EX SCUOLA EDISON – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIMOZIONE AMIANTO DAL TETTO DELL'EDIFICIO
CRONOPROGRAMMI DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA DEL PROCEDIMENTO		
	ATTIVITA'	DATA INIZIO
1	Progetto esecutivo	
1.1	Redazione Progettazione Esecutivo	31/12/18
1.2	Redazione Determina a contrarre, con validazione Progetto Esecutivo	10/01/19
1.3	Approvazione Determina a contrarre	31/01/19
2	Affidamento lavori	
2.1	Gara gg. 60	01/04/19
2.2	Aggiudicazione gg. 30	01/05/19
2.3	Termine dilatorio art. 32 c. 9 D.Lgs. 50/2016 gg. 35	05/06/19
2.4	Redazione contratto gg. 60	04/08/19
3	Esecuzione, collaudo e consegna	
3.1	Esecuzione lavori complessivi gg. 180, suddivisi in:	
3.1.1	Presentazione documentazione all'ASL e validazione gg. 30	03/09/19
3.1.2	Esecuzione intervento complessivi gg. 150	31/01/20
3.2	Collaudo dell'opera gg. 90	30/04/20
3.3	Consegna	30/05/20

PROGETTO ESECUTIVO
C.I. 14397 EX SCUOLA EDISON – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIMOZIONE AMIANTO DAL TETTO DELL'EDIFICIO
CRONOPROGRAMMI DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI

ATTIVITA'	2019												2020					
	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.
1 Progetto esecutivo																		
1.1 Redazione Progettazione Esecutivo																		
1.2 Redazione Determina a contrarre, con validazione Progetto Esecutivo																		
1.3 Approvazione Determina a contrarre																		
2 Affidamento lavori																		
2.1 Gara gg. 60																		
2.2 Aggiudicazione gg. 30																		
2.3 Termine dilatorio art. 32 c. 9 D.Lgs. 50/2016 gg. 35																		
2.4 Redazione contratto gg. 60																		
3 Esecuzione, collaudo e consegna																		
3.1 Esecuzione lavori complessivi gg. 180, suddivisi in:																		
3.1.1 Presentazione documentazione all'ASL e validazione gg. 30																		
3.1.2 Esecuzione interventi gg. 150																		
3.2 Collaudo dell'opera gg. 90																		
3.3 Consegna																		

redazione gruppo di lavoro: geom. Chiara Furlanetto, geom. Maurizio Longato, p.i. Andrea De Martin Fabbro

PROGETTO ESECUTIVO
C.I. 14397 EX SCUOLA EDISON – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIMOZIONE AMIANTO DAL TETTO DELL'EDIFICIO
CRONOPROGRAMMI DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI

		CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																											
		Annualità 2019																										Ann. 2020	
		A/S	S	S	S	S/O	O	O	O	O/N	N	N	N/D	D	D	D	D	D	D	G	G	G	G	G	G	G	G		
		Tempo affidato all'appaltatore complessivo giorni 180																											
3	Presentazione documentazione all'ASL con validazione ed Esecuzione Lavori	pratiche	esecuzione interventi																										
		30	150																										
		7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	150						
3.1	Esecuzione lavori complessivi gg. 180, suddivisi in:																												
3.1.1	Presentazione documentazione all'ASL e validazione gg. 30 ed analisi materiali per identificazione pericolosità e codice CER																												
3.1.2	Esecuzione lavori complessivi gg. 150																												
	Cantiere																												
	Rimozione pensilina metallica																												
	Bonifica cisterna in gasolio																												
	Fabbricato Corpo 1 vicino palestra																												
	Fabbricato Corpo 2 centrale																												
	Fabbricato Corpo 3 lato via Oroboni																												
	Ripristino Soffittature con impianti																												
	Risanamenti c.a.																												
	Opere varie																												
	Smontaggio cantiere																												
