


CI 15269

AREA LAVORI PUBBLICI,
MOBILITÀ E TRASPORTI

GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2023

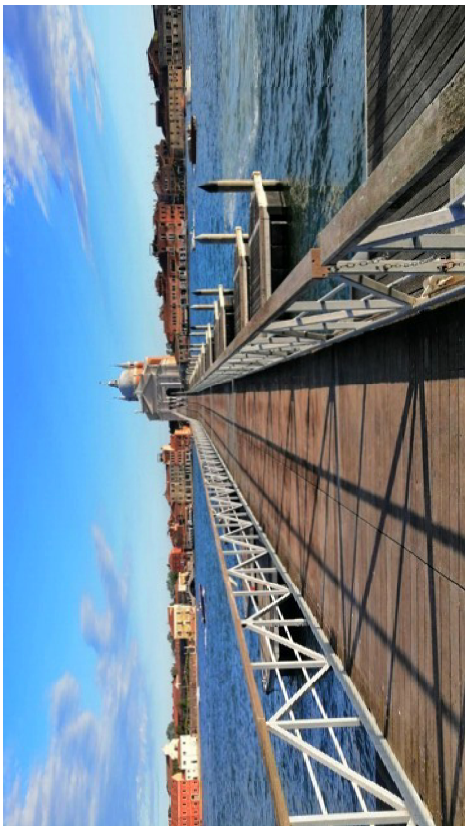

PROGETTO ESECUTIVO comprensivo delle fasi precedenti
Elaborati Grafici
Venezia, 05 marzo 2023


TAV. 08
Schema assemblaggio Ponte Venice Marathon

Progettista e Responsabile Unico del Procedimento
Dot. Arch. Roberto Megera
(atto firmato digitalmente)

Servizio Tecnico Veitas
geom. Matteo Vianello
(atto firmato digitalmente)


Collaboratori
arch. Ilaria Lucia Russo
arch. Ilaria Lucia Russo
(atto firmato digitalmente)

N.B.: TUTTE LE MISURE E LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE

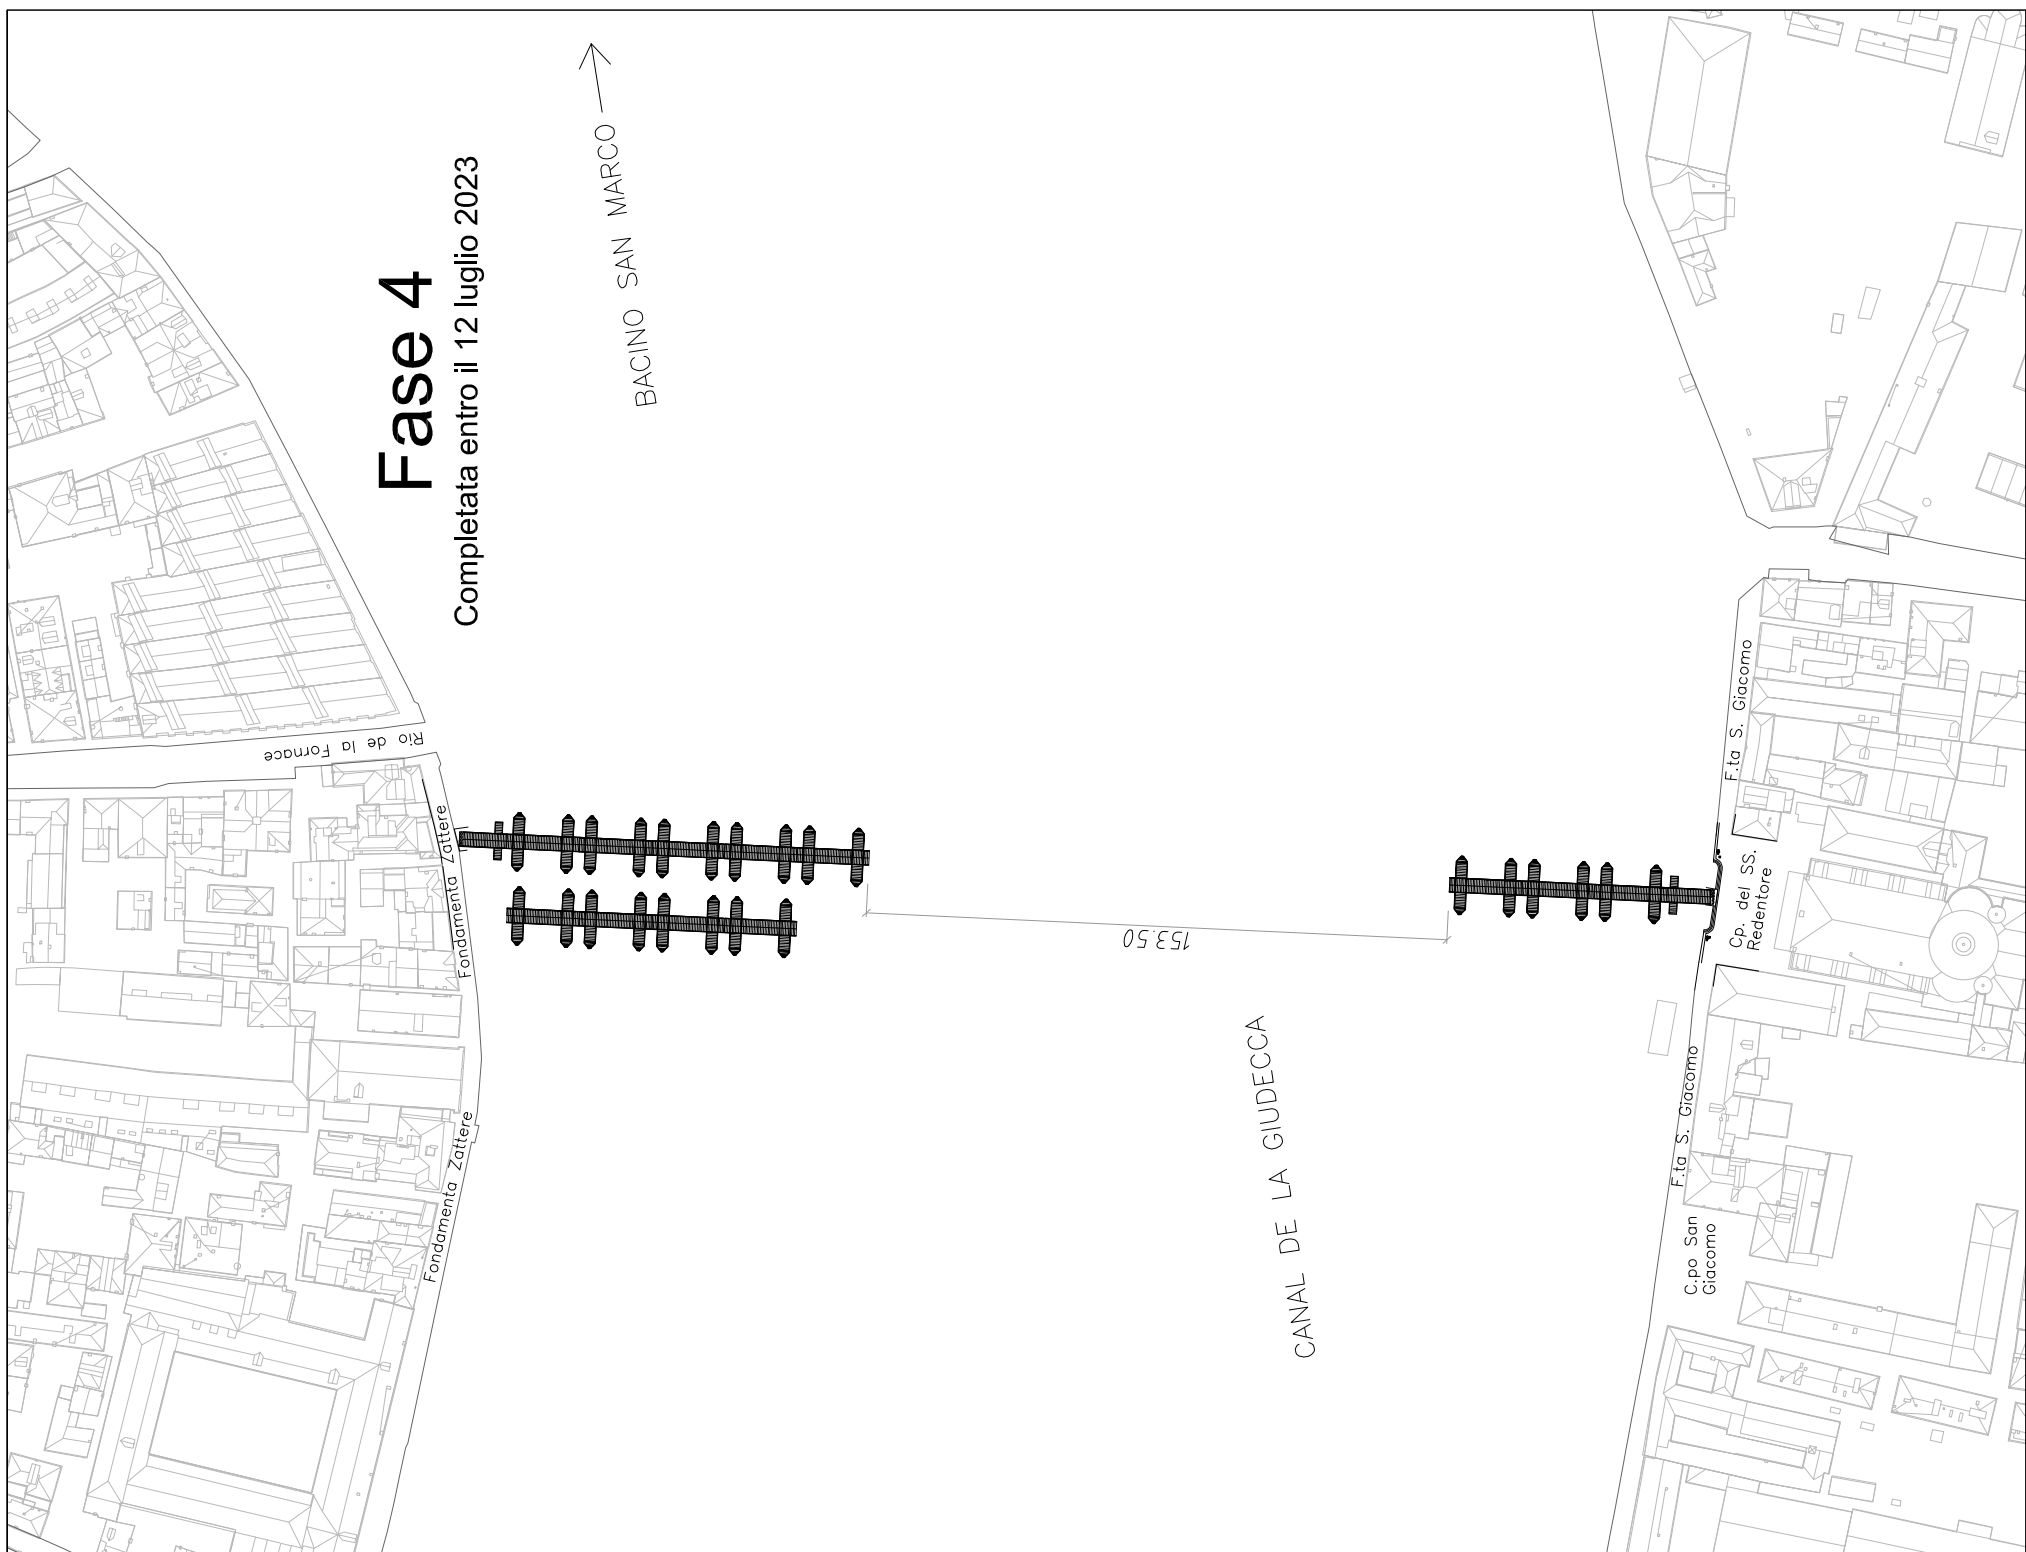


Fase 4

Completata entro il 12 luglio 2023

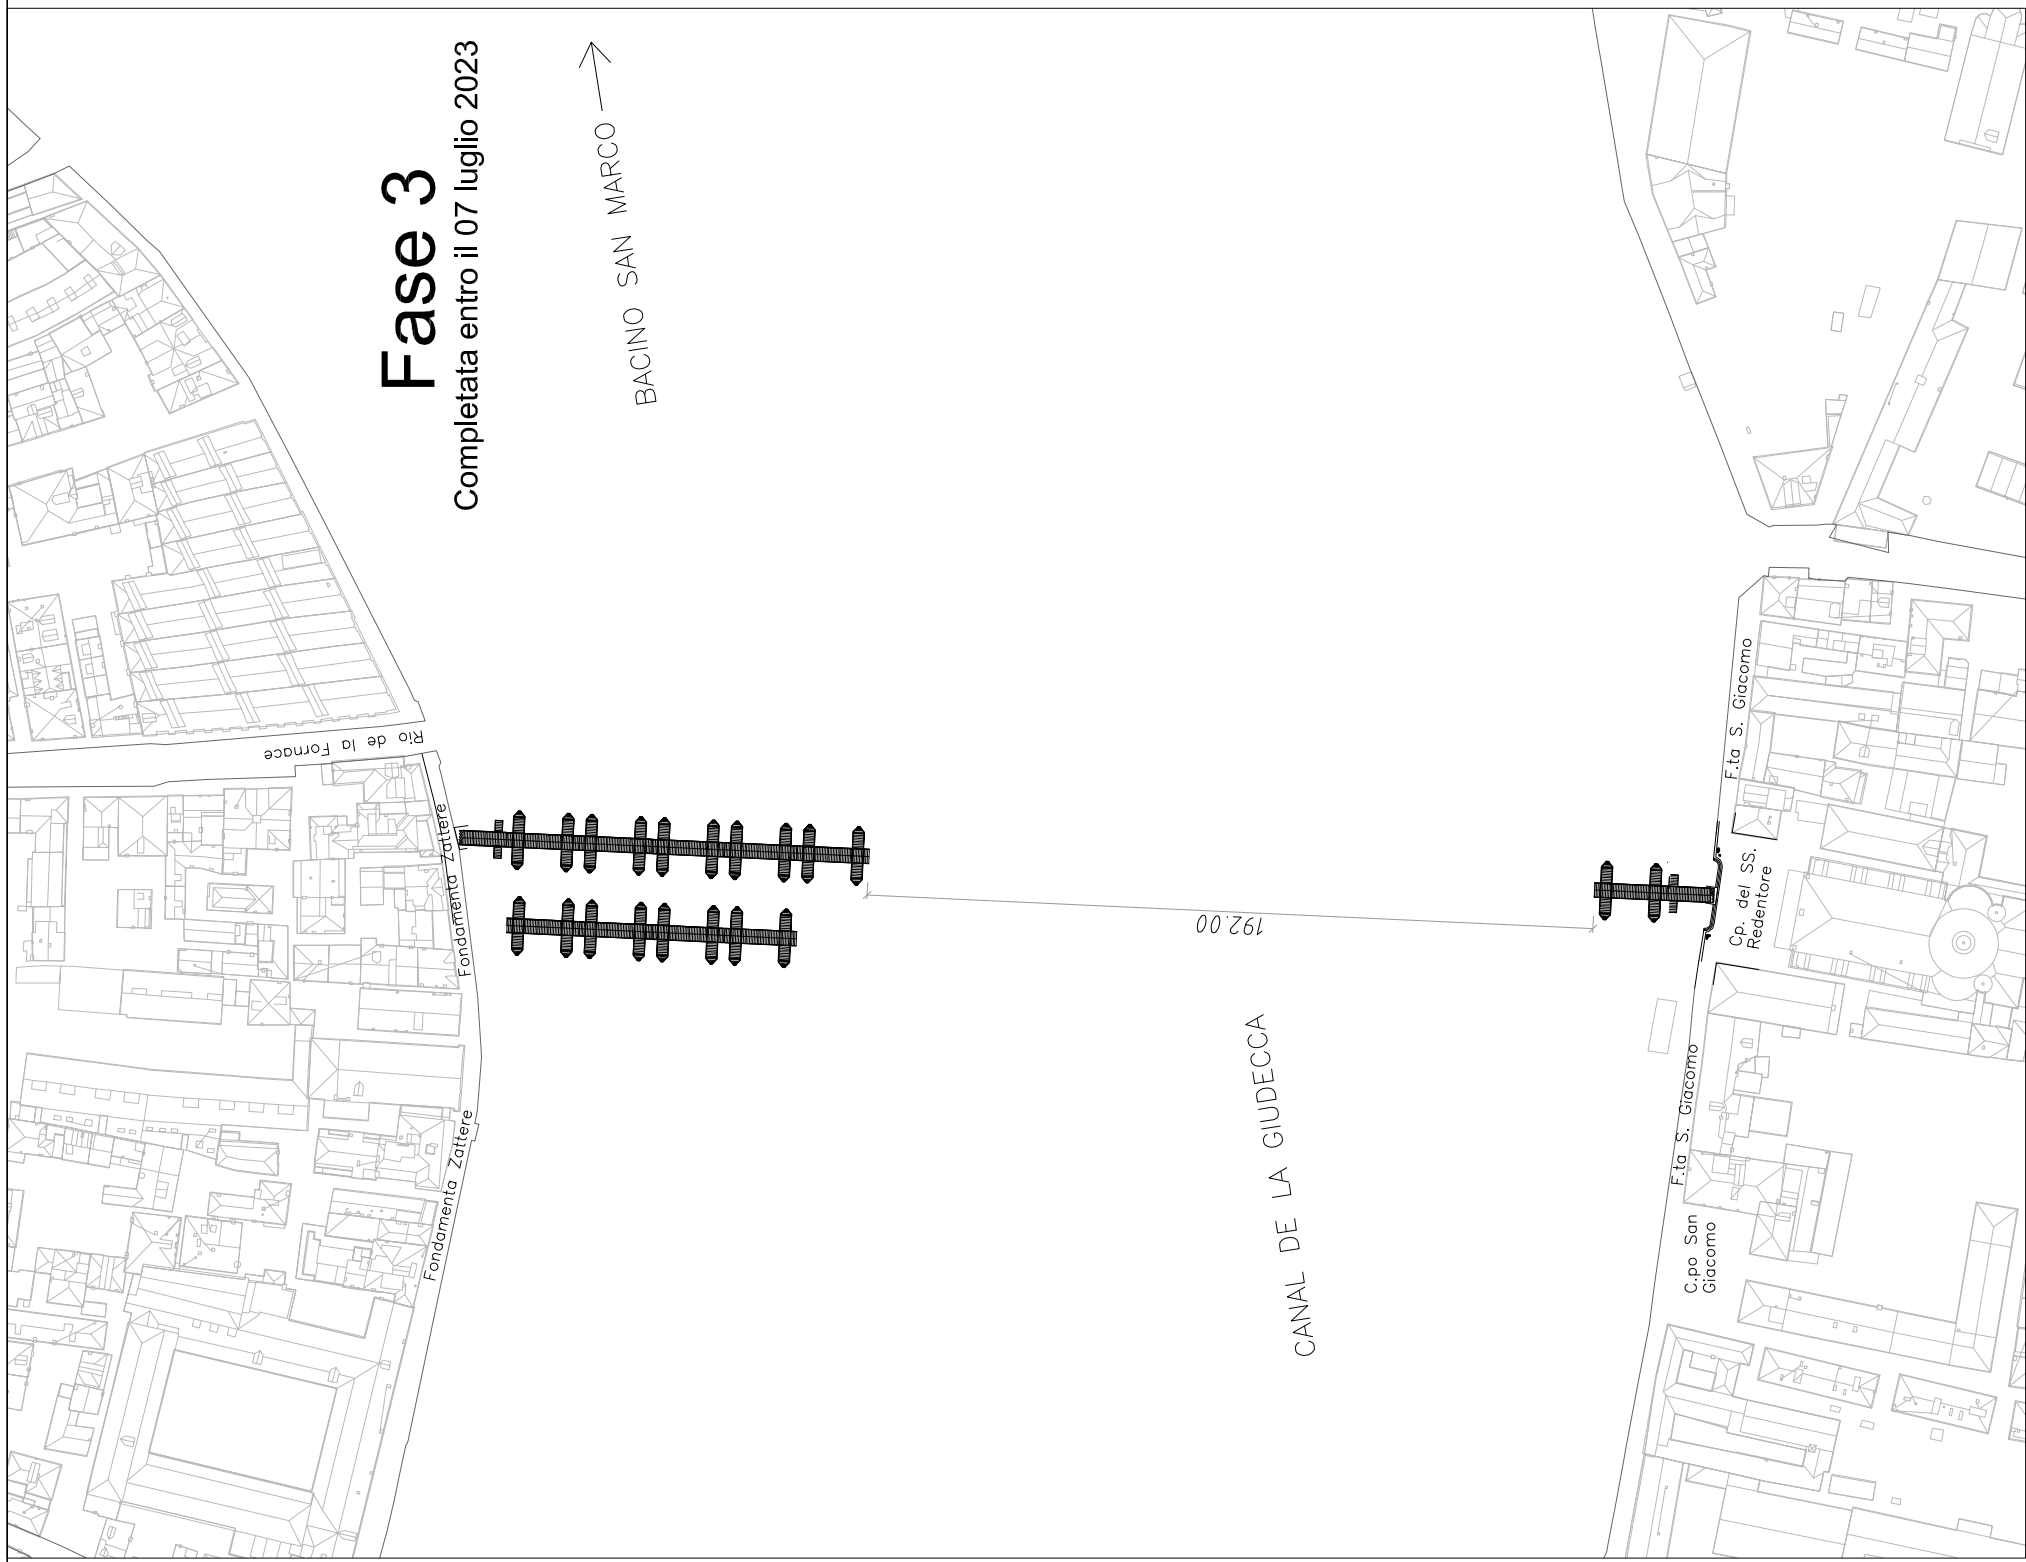

Fase 3

Completata entro il 07 luglio 2023

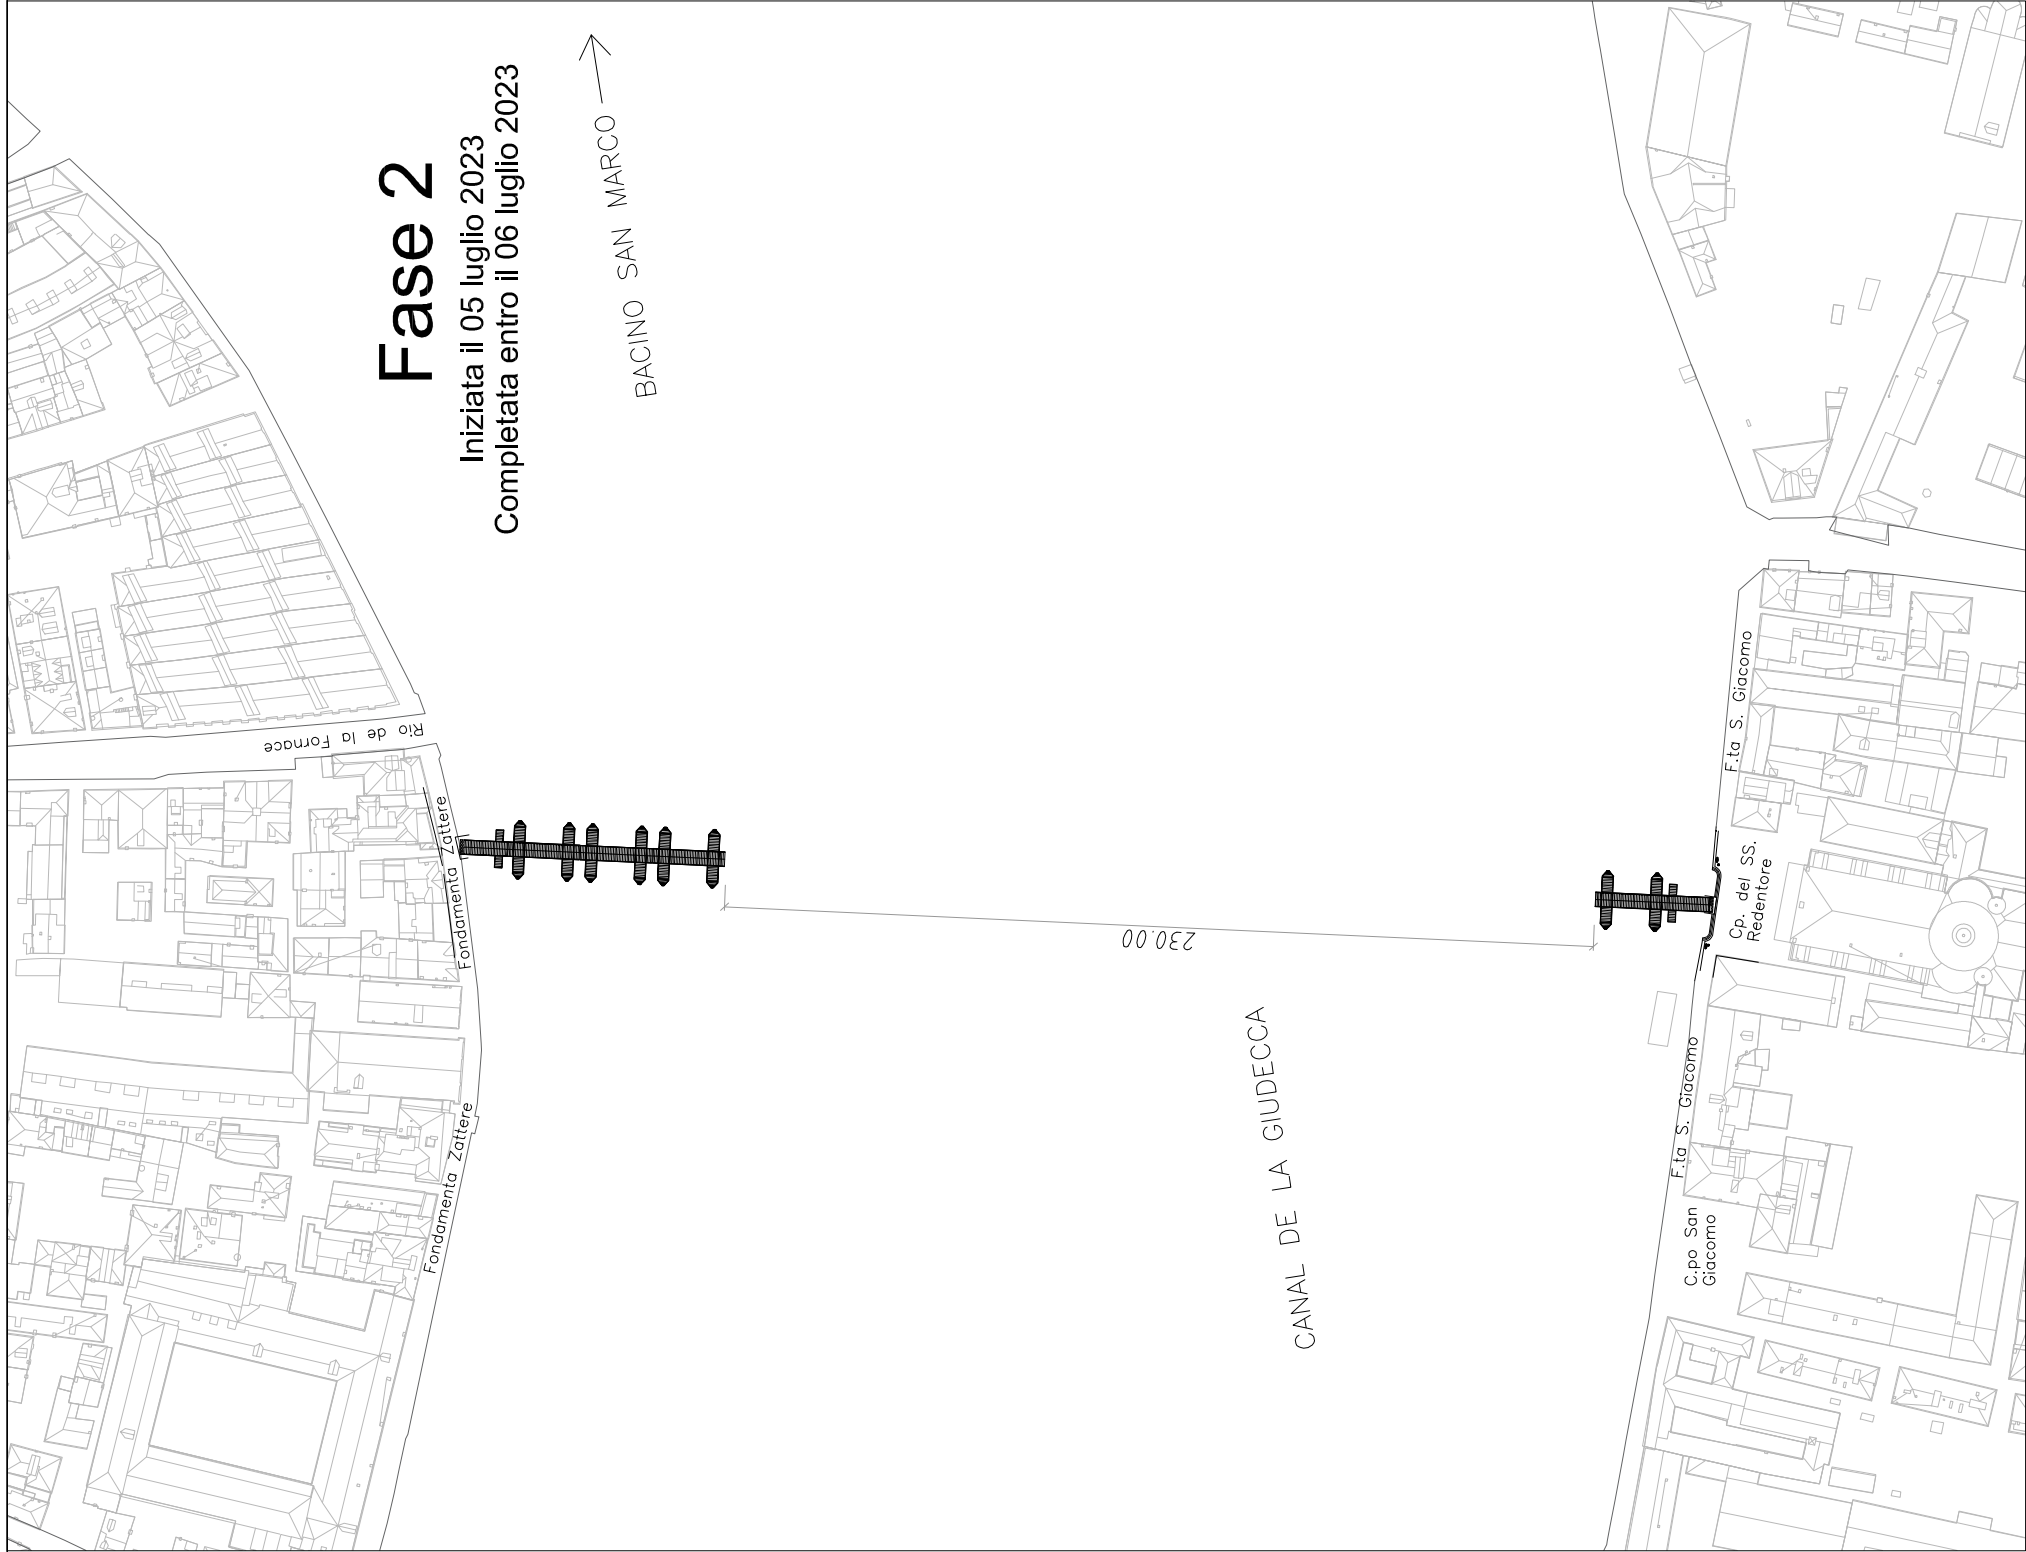


Fase 2

Iniziata il 05 luglio 2023
Completata entro il 06 luglio 2023



Fase 1


Iniziata il 03 luglio 2023
Completata entro il 04 luglio 2023

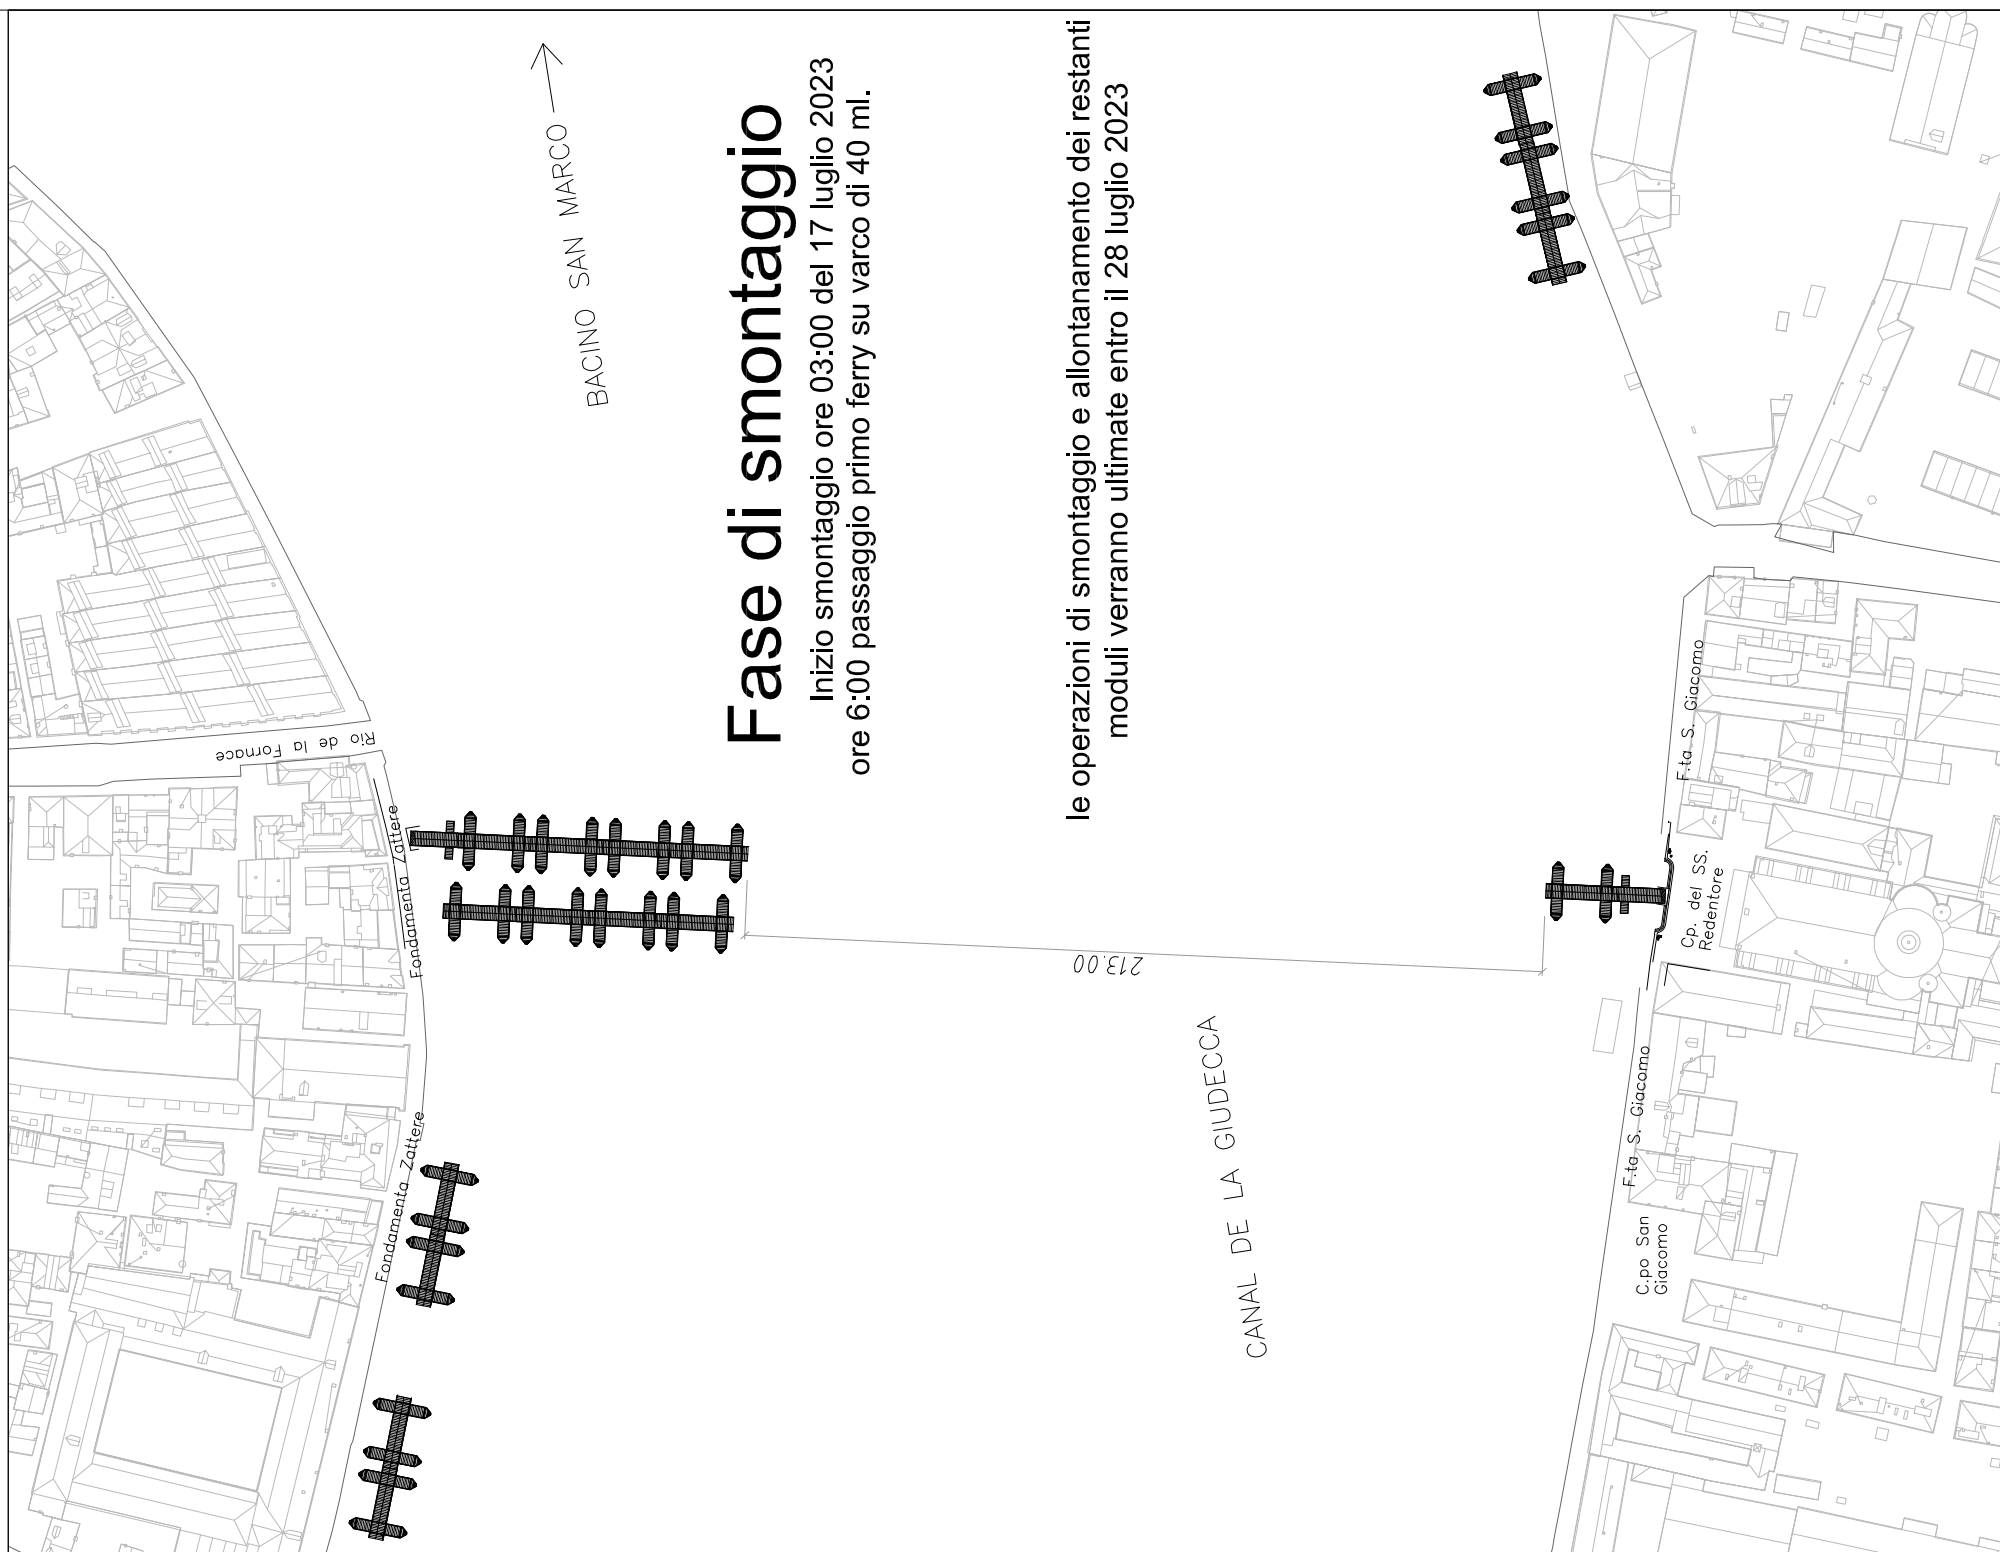

Fase di smontaggio


Inizio smontaggio ore 03.00 del 17 luglio 2023
ore 6.00 passaggio primo ferry su varco di 40 ml.

le operazioni di smontaggio e allontanamento dei restanti
moduli verranno ultimate entro il 28 luglio 2023

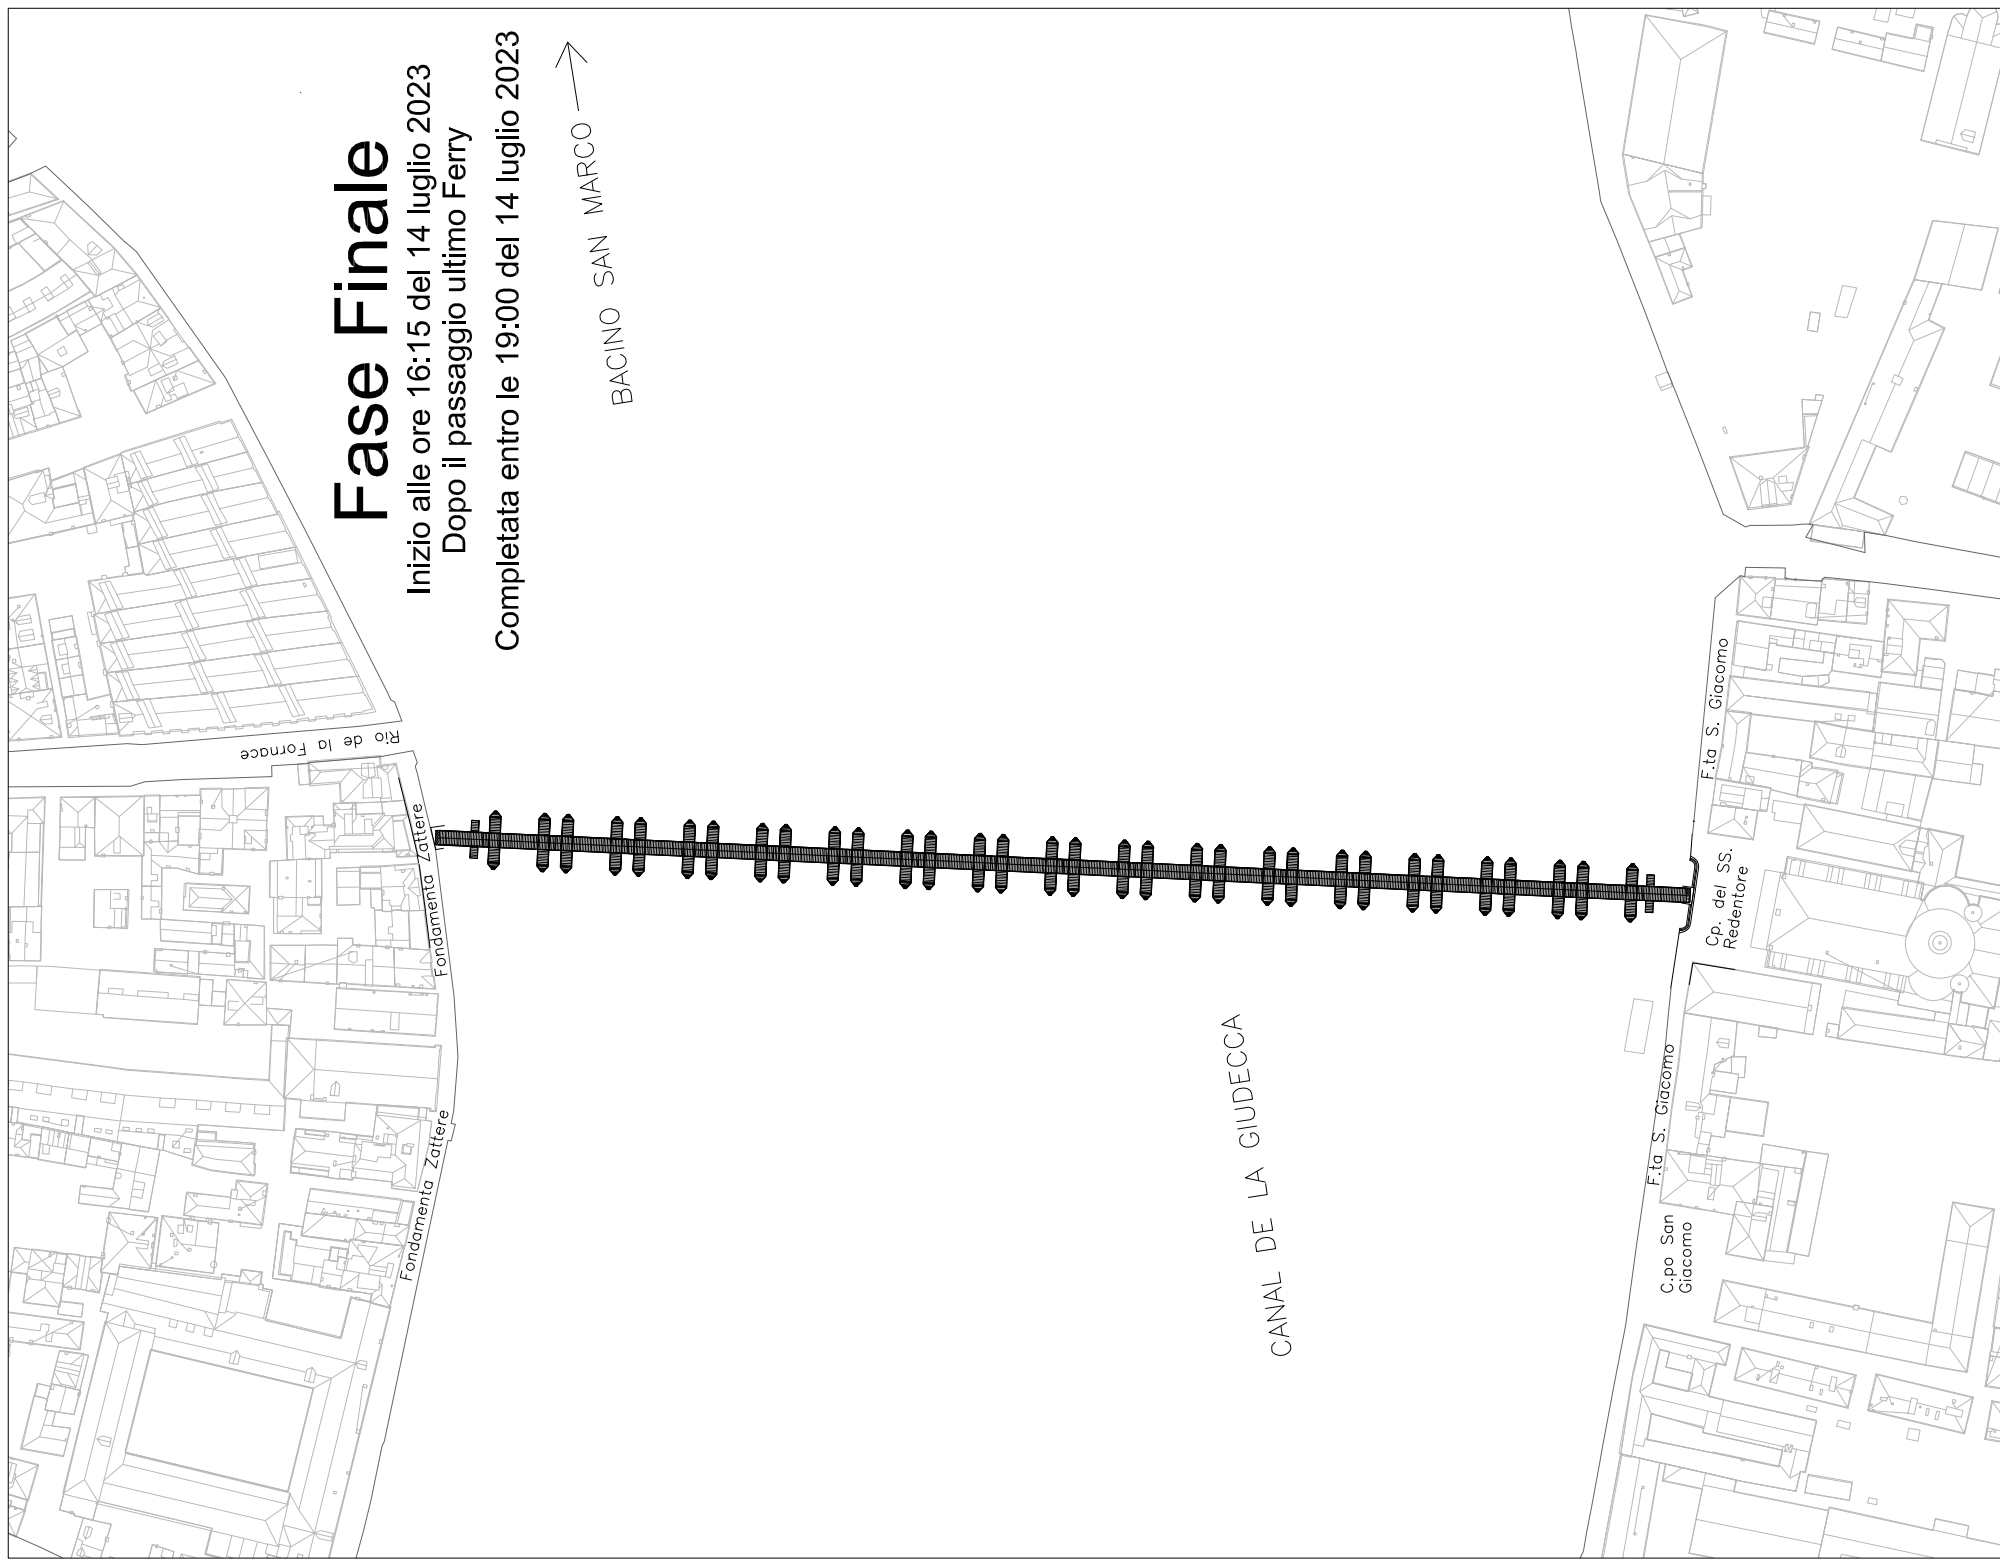


Fase Finale

Inizio alle ore 16:15 del 14 luglio 2023
Dopo il passaggio ultimo Ferry
Completata entro le 19:00 del 14 luglio 2023

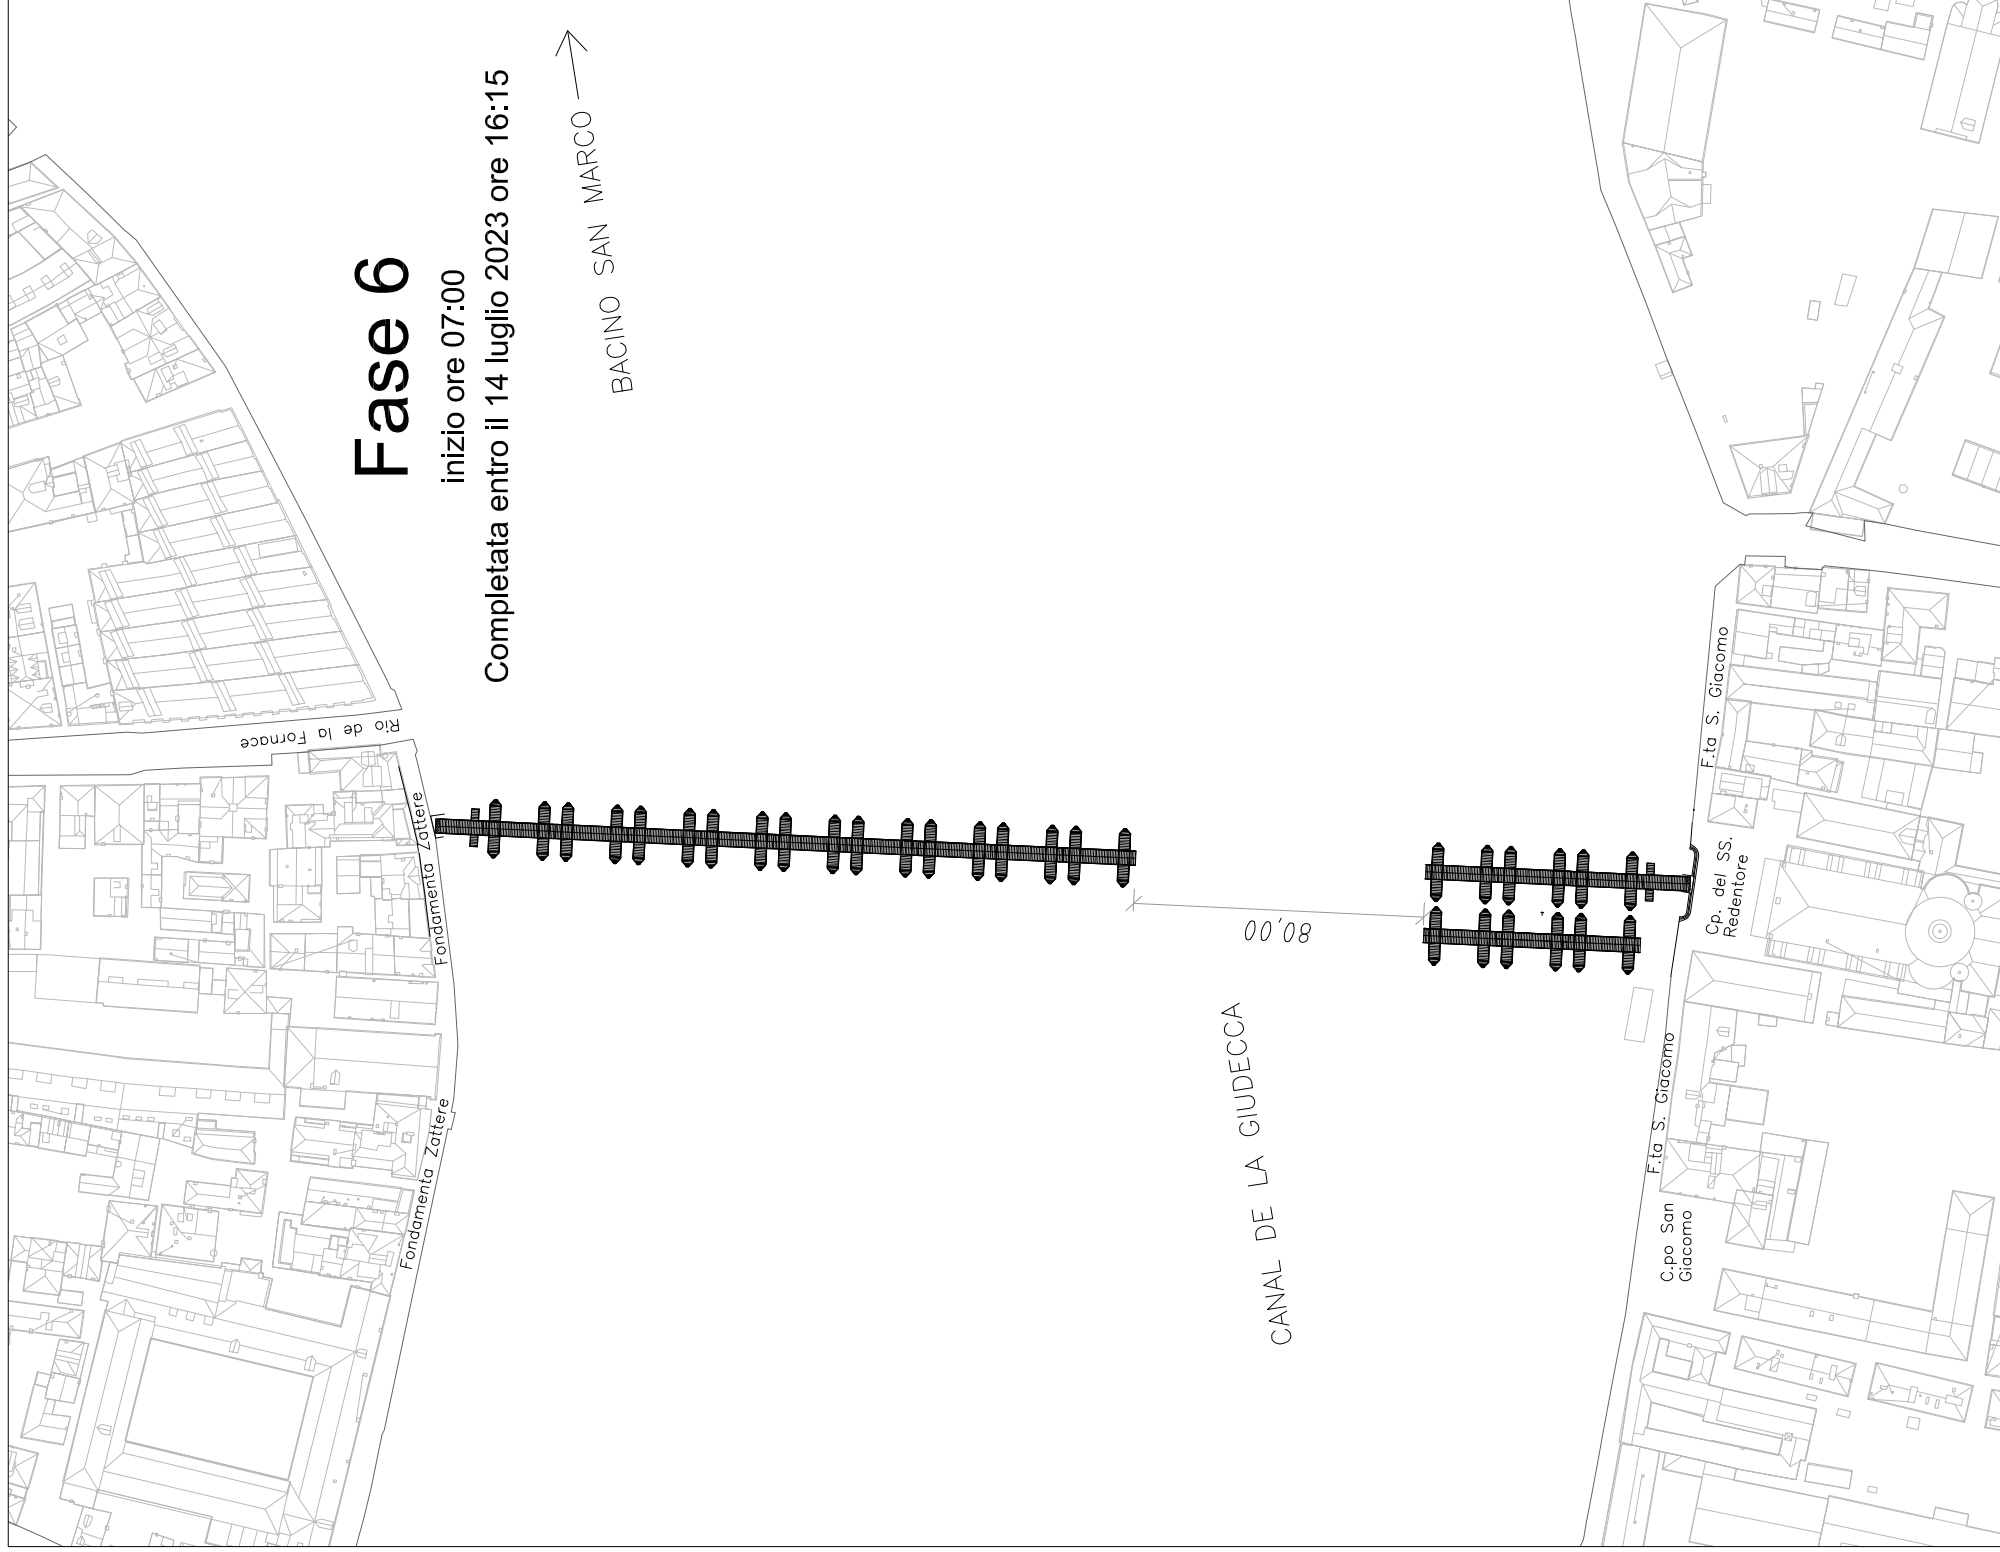

Fase 6

inizio ore 07:00
Completata entro il 14 luglio 2023 ore 16:15

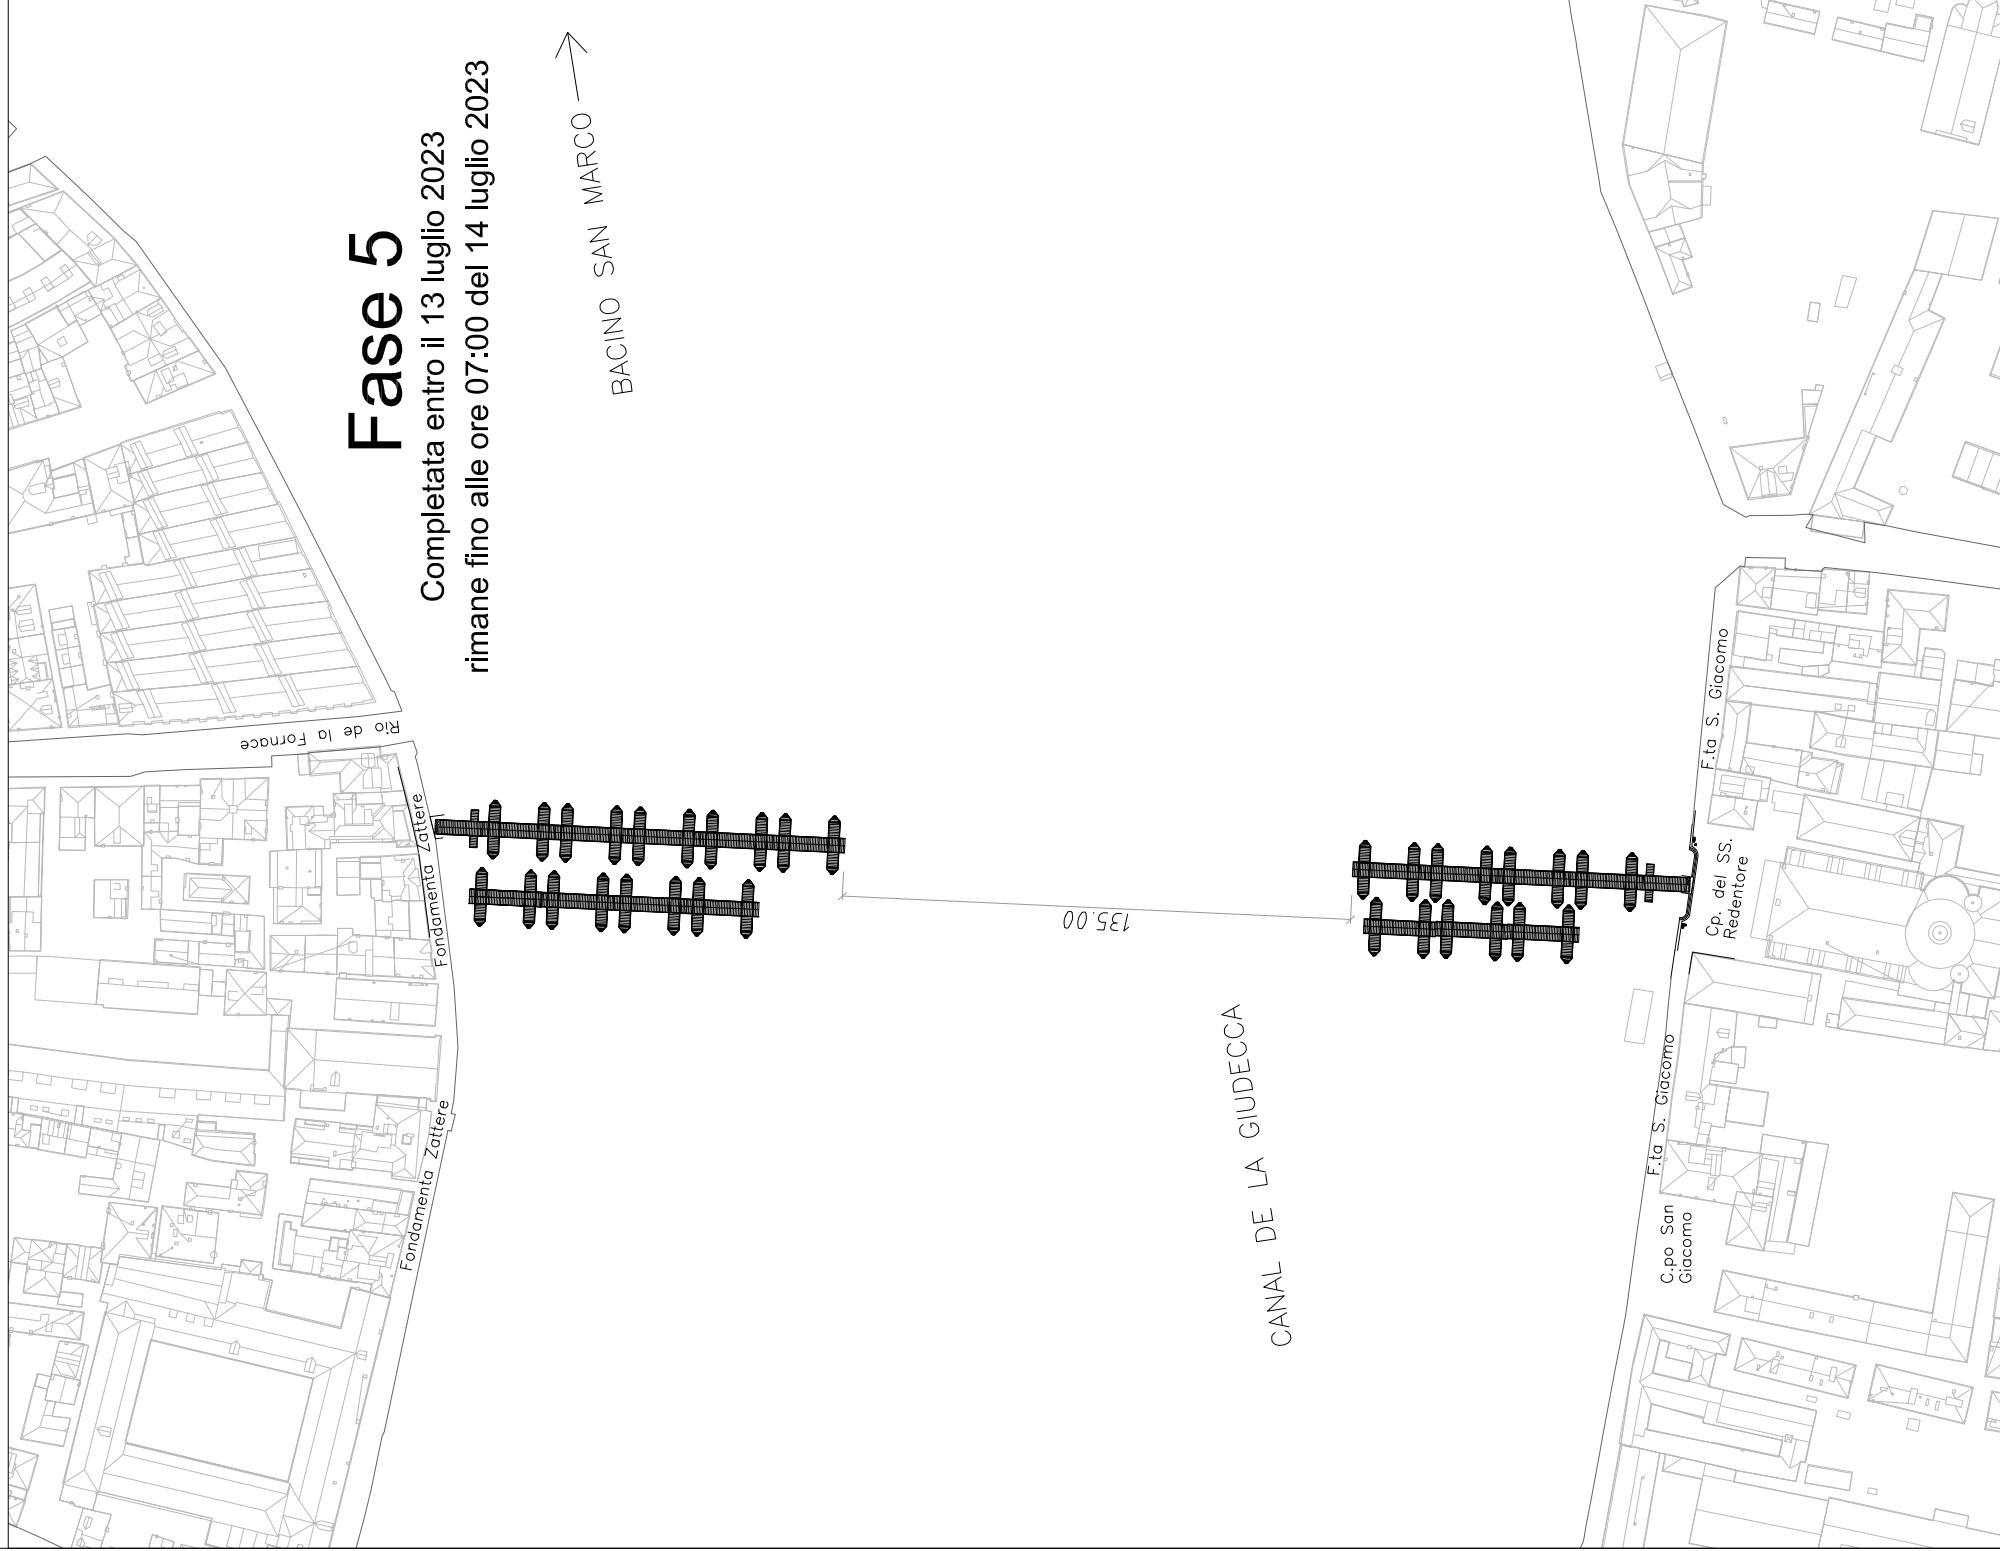

Fase 5

Completata entro il 13 luglio 2023
rimane fino alle ore 07:00 del 14 luglio 2023
